

Hei!

Työmaan tämän hetken asennustyöt ovat pääosin seuraavia töitä:


Sähköasentajat jatkavat valaisinten asennuksia ja sähkökalusteiden asennuksia. Av-koteloiden asennus ja kaapelointi jatkuu. Sähkökeskusten asennukset ovat alkamassa

Lv- kalustus on pääosin tehty. 2. krs wc kalustus vielä hieman kesken.

Sisätyövaiheet alla olevien kuvien ja selostusten mukaisesti.




Salin akustiikkaverhous on pääosin asennettu. Viimeistely- ja listoitustyöt ovat käynnissä.

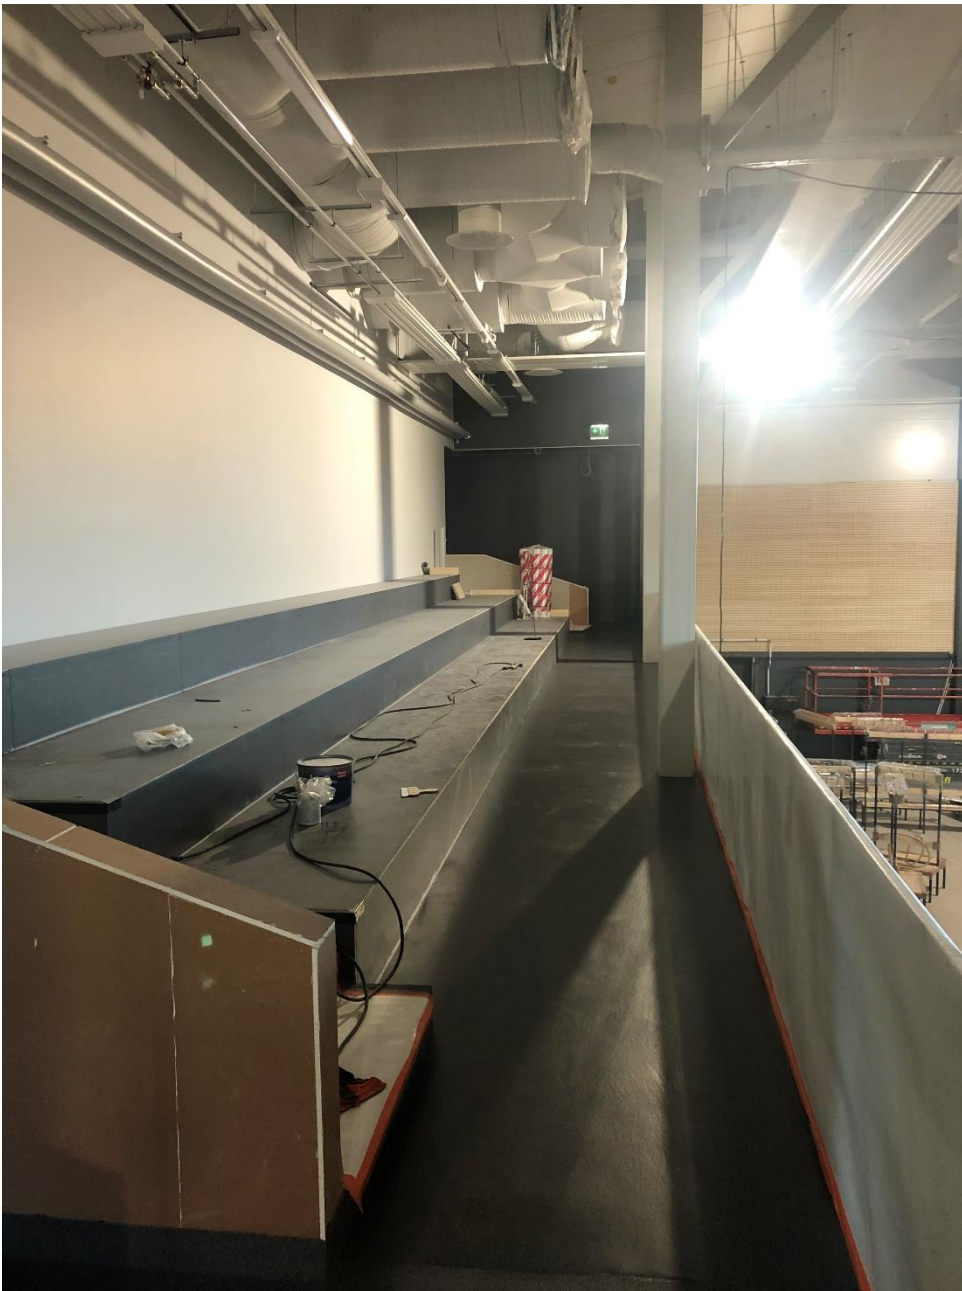

Katsomon penkit on päällystetty matolla ja lattian akrylipinnoitteet on tehty. Istuimeksi tulee vielä läpivärjätty puukuitulevy.


Parven alueen maalaus ja muut viimeistelytyöt käynnissä. Lasikaide asennettu parven reunaan ja suojattu rakennuspahvilla.

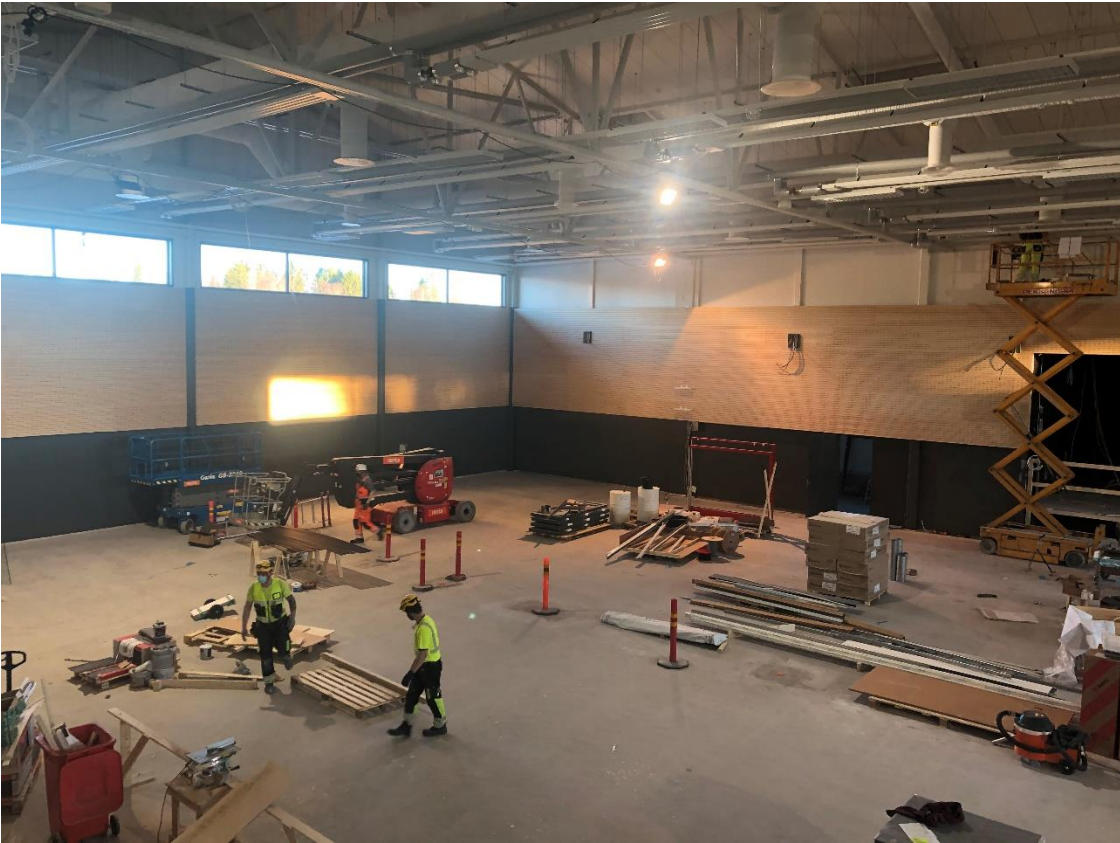

Seinälevytyksiä tehty



Lasikaide asennettu

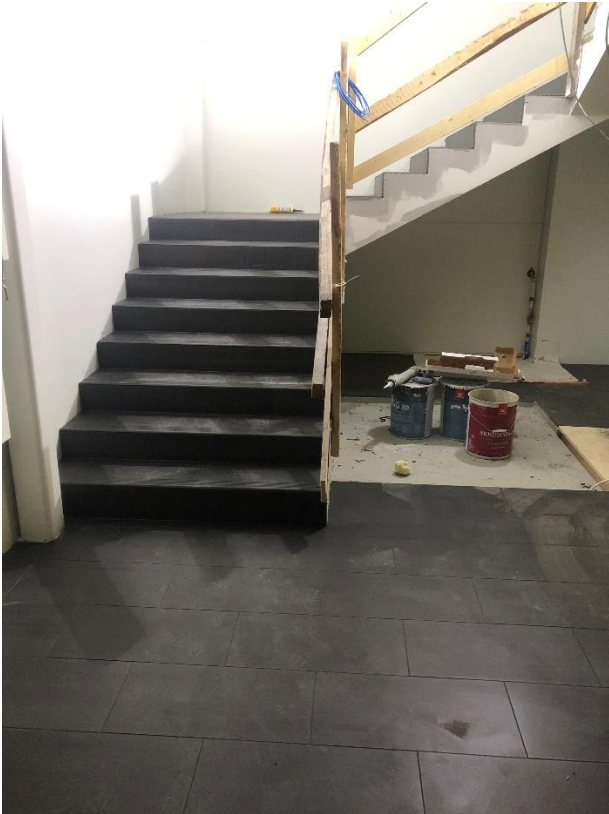

Pääsisäänkäynnin portaat laatoitettu



Seuraavaksi suojataan portaat ja asennetaan kaiteet ja käsijohteet



Julkisivun panelointi viimeisellä sivulla. Taustalla näkyy myös asennettuna aurinkosuojasäleiköt.



Varaston seinät paneloitu. Viimeistelytyöt aloitettu (listoitukset, pellitykset yms.)



Kaluste- ja varustetoimitukset ja asennukset jatkuvat.

Työmaavierailijoiden käytettävä työmaalla kypärää ja heijastinliiviä, sekä kasvomaskia vierailun aikana!

Jos kysyttävää, olkaa yhteydessä

Terv, Antti Uski p. 040 5594333

antti.uski@pallasrakennus.fi
